МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗВІТ

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«УПРАВЛІННЯ ІТ ПРОЄКТАМИ»

Виконав студент групи КН-23-1

Полинько Ігор Миколайович

Перевірив: ассистент кафедри АІС Андреєв П. І.

Кременчук 2026

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Тема: Початок роботи з MS Project

Мета: отримати практичні навички щодо підготовки проекту в середовищі MS Project.

Порядок виконання роботи:

3. Проведення маркетингових досліджень

Ви − Менеджер з маркетингу виробничого підприємства «XYZ», що продає побутову техніку. Вам необхідно провести маркетингове дослідження переваг споживачів для правильного позиціонування товару на ринку і вибору оптимальної стратегії розвитку підприємства. Ви вирішили, що дослідження проводитиметься в магазинах з продаж побутової техніки за допомогою інтерв'ю або вільного розповсюдження анкет. Розробіть план проведення маркетингових досліджень виходячи з урахуванням того, термін реалізації проекту не повинний перевищувати 2 міс.

Зразковий список завдань.

1. Визначення необхідності проведення дослідження – віха.

2. Розробка плану дослідження.

2.1. Постановка завдання і визначення цілей дослідження − 3 дні.

2.2. Визначення методів дослідження, сферу охоплення і прийнятної точності досліджень − 3 дні.

2.3. Визначення бюджету проекту − 2 дні.

2.4. Розробка критеріїв ефективності проведення дослідження − 1 день.

2.5. Оформлення плану досліджень − 3 дні.

3. Підготовчий етап

3.1. Розробка анкет для опиту − 3 дні.

3.2. Тестування анкет − 5 днів.

3.3. Затвердження макету − 1 день.

3.4. Наймання додаткового персоналу − 5 днів.

3.5. Підготовка персоналу − 1 день.

3.6. Друкування анкет − 2 дні.

3.7. Придбання інших витратних матеріалів − 2 дні.

4. Проведення дослідження

4.1. Розповсюдження анкет – 3 дні

4.2. Проведення анкетування – 10 днів

5. Обробка результатів досліджень

5.1. Збирання анкет – 10 днів

5.2. Обробка анкет, угрупування початкових даних – 5 днів

6. Аналіз

6.1. Аналіз результатів – 5 днів

6.2. Вироблення рекомендацій – 3 дні

6.3. Оцінка ефективності досліджень – 2 дні

7. Періодичний контроль за реалізацією проекту – двічі в тиждень.

Тип планування - від початкової дати. Календар проекту – робота з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00 з перервою на обід. Робочий тиждень – 40 годин.

Варіант: 15

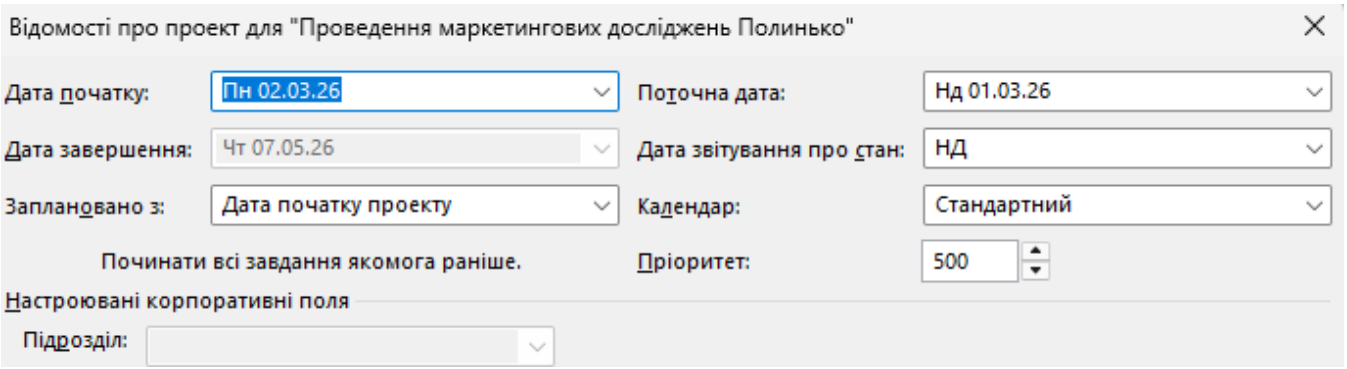

Рисунок 1.1 – Відомості про проект

		Режим завдан	Ім'я завдання	Тривалість	Початок	Завершені	Попередники	Іме
1			Визначення необхідності проведення дослідження	0 днів				
2			**Розробка плану дослідження**	**49 днів**	**Пн 02.03.26**	**Чт 07.05.26**		
3			Постановка завдання і визначення цілей	3 днів				
4			Визначення методів дослідження	3 днів				
5			Визначення бюджету	2 днів				
6			Розробка критеріїв ефективності	1 день				
7			Оформлення плану	3 днів				
8			**Підготовчий етап**	**49 днів**	**Пн 02.03.26**	**Чт 07.05.26**		
9			Розробка анкет	3 днів	Пн 02.03.26	Ср 04.03.26		
10			Тестування анкет	5 днів	Чт 05.03.26	Ср 11.03.26	9	
11			Затвердження макету	1 день	Чт 12.03.26	Чт 12.03.26	10	
12			Наймання персоналу	5 днів	Пн 02.03.26	Пт 06.03.26		
13			Підготовка персоналу	1 день	Пн 09.03.26	Пн 09.03.26	12	
14			Друкування анкет	2 днів	Пт 13.03.26	Пн 16.03.26	11	
15			Придбання матеріалів	2 днів	Пн 02.03.26	Вт 03.03.26		
16			**Проведення дослідження**	**48 днів**	**Вт 03.03.26**	**Чт 07.05.26**	**15**	
17			Розповсюдження анкет	3 днів	Вт 17.03.26	Чт 19.03.26	14	
18			Проведення анкетування	10 днів	Пт 20.03.26	Чт 02.04.26	17	
19			**Обробка результатів**	**48 днів**	**Вт 03.03.26**	**Чт 07.05.26**		
20			Збирання анкет	10 днів	Пт 03.04.26	Чт 16.04.26	18	
21			Обробка та угрупування даних	5 днів	Пт 17.04.26	Чт 23.04.26	20	
22			**Аналіз**	**48 днів**	**Вт 03.03.26**	**Чт 07.05.26**		
23			Аналіз результатів	5 днів	Пт 24.04.26	Чт 30.04.26	21	
24			Вироблення рекомендацій	3 днів	Пт 01.05.26	Вт 05.05.26	23	
25			Оцінка ефективності	2 днів	Ср 06.05.26	Чт 07.05.26	24	
26			**Контроль реалізації проєкту**	**46 днів**	**Вт 03.03.26**	**Вт 05.05.26**		

Рисунок 1.2 – Список завдань

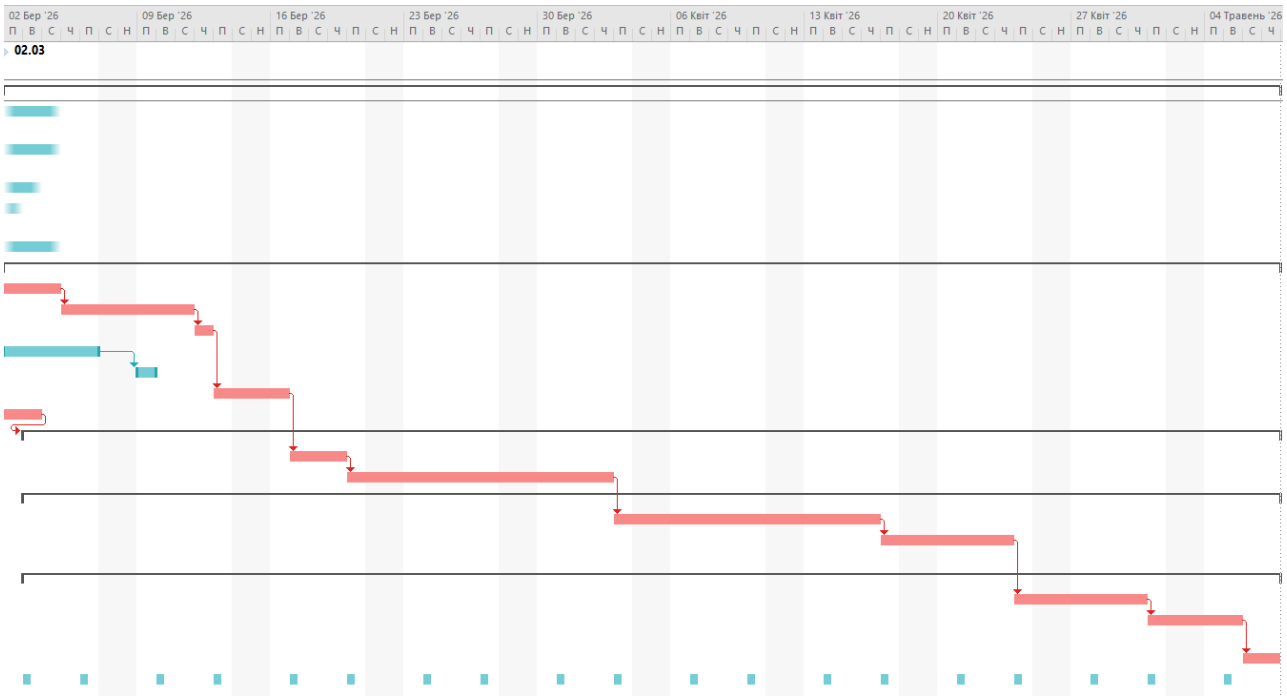

Рисунок 1.2 – Діаграма Ганта

Висновок: на цій лабораторній роботі ми отримали практичні навички щодо підготовки проекту в середовищі MS Project, створили проект, визначили графік роботи, список завдань, їх тривалість та встановили зв'язки між завданнями. Сформували діаграму Ганта з критичними завданнями та повторювальним завданням та отримали термін реалізації проекту, що обмежується двома місяцями.

Контрольні питання:

1. Що таке управління проектами? Наведіть приклад проекту:

Управління проектами – це процес планування, організації, виконання та контролю робіт для досягнення мети проекту з урахуванням обмежень часу, бюджету та ресурсів.

Приклад проекту:

Проведення маркетингового дослідження, розробка програмного забезпечення, створення вебсайту.

2. Назвіть основні параметри проекту. Який їх взаємозв'язок?

Основні параметри проекту:

– Тривалість проекту.

– Обсяг робіт.

– Вартість.

– Якість.

– Ресурси.

Взаємозв'язок:

Зміна одного параметра впливає на інші. Наприклад, скорочення термінів може збільшити витрати або знизити якість.

3. Основні етапи проекту:

1) Ініціація.

2) Планування.

3) Виконання.

4) Моніторинг і контроль.

5) Завершення проекту.

4. Призначення і можливості MS Project:

Microsoft Project використовується для:

– Планування проектів.

– Побудови календарних графіків.

– Визначення критичного шляху.

– Управління ресурсами.

– Контролю виконання завдань.

– Аналізу завантаження виконавців.

5. Дії для створення і налаштування проекту в MS Project:

– Створити новий файл проекту.

– Встановити дату початку проекту.

– Налаштувати календар робочого часу.

– Ввести задачі.

– Встановити тривалість завдань.

– Зв’язати задачі залежностями.

6. Календар проекту і як його налаштовувати:

Календар проекту визначає робочі та неробочі дні, робочий час і перерви.

Налаштування:

– Вкладка Проект → Змінити робочий час.

– Встановити робочі години.

– Визначити вихідні та святкові дні.

7. Як ввести список завдань проекту:

– Перейти у режим діаграми Ганта.

– Увести назви завдань у таблицю.

– Встановити тривалість завдань.

– При необхідності створити ієрархічну структуру задач.

8. Тривалість завдання:

Тривалість завдання – це час, необхідний для виконання роботи.

Зразкова тривалість задається шляхом введення часу з знаком питання, наприклад:

3д?

9. Що таке віха?

Віха – це задача з нульовою тривалістю, яка позначає важливу подію або завершення етапу проекту.

10. Завдання, що повторюється

Це задача, яка виконується регулярно з певною періодичністю (наприклад, щотижневий контроль).

Створюється через меню Вставка → Повторювана задача**.**

11. Обмеження щодо термінів виконання задач

Можуть використовуватись обмеження:

– Почати не раніше.

– Закінчити не пізніше.

– Фіксована дата початку або завершення.

12. Критичний шлях

Критичний шлях – це послідовність задач, від якої залежить загальна тривалість проекту.

Затримка критичної задачі призводить до затримки всього проекту.

13. Коректування і оптимізація календарного плану

– Зміна залежностей між задачами

– Введення випередження або запізнювання.

– Перегляд обмежень задач.

– Аналіз критичного шляху.
